
平成19年1月~平成19年3月

平成 19 年 1 月



野垂木と、構造補強のための水平筋違を 取付けている様子です。

平成 19 年 2 月

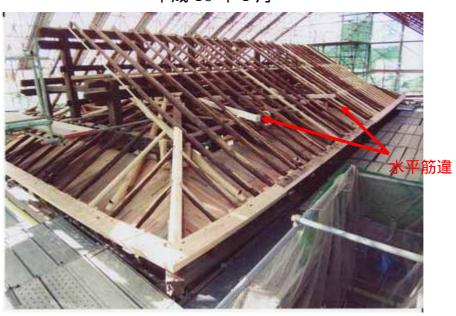

野小舞を取付けている様子です。



土居葺が完了しました。

平成 19 年 3 月



補足本瓦が納品になりました。



本瓦平葺の施工中です。 平瓦は 1/3 程度が重なっています。平瓦の上は丸瓦です。

平成 19 年 3 月




本瓦平葺の施工中です。 軒丸瓦へ瓦釘を取付けています(南面)。



本瓦平葺が完了しました。 (左側が北面)

平成 19 年 3 月

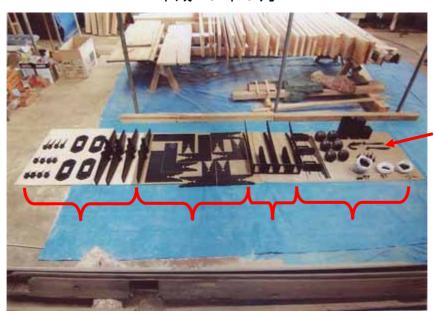

1 階正面両開大扉用の建具金物です。 左から 肘壺金物、 隅金物、 八双鉄物、 門金物(海老錠)です。



1階背面用雨落石の補足石材が納品になりました。

平成 19 年 3 月



2 階正背面用建具が 5 間分納品になりました。

1間につき板戸2枚・明障子1枚を使います。
