


占用・自営工事完了届施工写真等チェックリスト

提出者 _____

1. 着工前、竣工の写真は同一方向で対比できるように撮影されているか。
2. 掘削後、既設路盤構成をスタッフ、リボンテープ等を使用し、撮影されているか。
3. 既存舗装構成調査票が添付されているか。
4. 掘削深H = 1.5mを超える場合は、土留め等対策がなされているか。
5. 黒板等を使い工事工程毎に作業内容、作業状況、仕上がり検測寸法使用材料を明示しているか。

例 表層工：転圧状況：検測
上層路盤工：転圧状況：検測
下層路盤工1層目：転圧状況：検測
下層路盤工2層目：転圧状況：検測
など

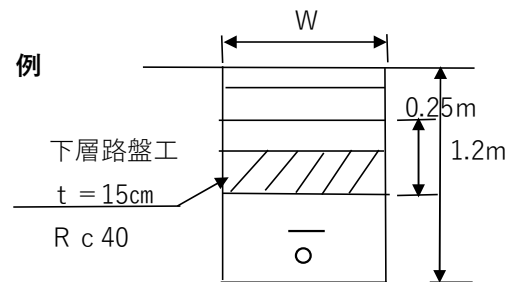

6. 埋設表示シート等は高さが分かるよう明確に撮影できているか。
7. 側溝、配水管等の構造物が既存する場合は、離隔が分かるよう撮影できているか。
8. 路体（舗装路盤底面から1.0m以下）の埋戻しの転圧厚さは30cm以下。
9. 路床（舗装路盤底面から1.0m以上）の埋戻しの転圧厚さは20cm以下。
10. 下層路盤工の t = 25cmは2層仕上げとなっているか。
11. 表層工のプライムコートは全面に必要量が散布されているか。
12. 舗装復旧舗装後の出来形検測は、リボンテープ等を使用し、明確に撮影できているか。
13. 既存の外側線等の付属物の復旧は、既設材料と同等品以上でできているか。
14. 占用延長が50m以上の場合は測点を定め、50m毎に工事工程ごとの撮影ができているか。
15. 出来形図が添付されているか。
